区画整理事業　造成工事について

1 【工事内容】

工事名	寄居町男衾地区土地区画整理事業　造成工事	
工期	令和４年１０月6日～令和5年１２月３１日　（工事は令和５年10月末までを予定）	
工事概要	整地土工	１式
	道路工	１式
	上下水道工	１式
	公園・調整池工	１式
	防火水槽工	１式
	ゴミ置場	１式
請負業者	矢作建設工業株式会社　　Tel 03-3555-3611	
	工事担当：桶田哲也	

2 【施工について】

作業時間	午前8：30～午後5：00
休日	日曜日、祝日、第２土曜日、第４土曜日 年末年始、GW、夏季
仮囲い	工事施工区域に誤って立ち入らないように仮囲いを設けます。【写-1】 工事車両出入口等には看板を設置して注意喚起します。
運行経路	現地へ資機材の運搬や作業で搬入する車両については県道「富田東」交差点より進入します。 現場付近では入退場は別ルートとし、出入口に誘導員を配置します。【図-1】
交通規制	現地の南側道路を施工する際に一時道路を規制して施工します。詳細が決まり次第近隣に案内します。

工事工程表より　【図-2】

準備工　12月中旬より現地の除草・伐採や工事用の進入路等を設置します。

整地土工　現地に土砂を搬入して周辺の道路と同程度の高さまで地盤を嵩上げします。
搬入する土砂は寄居町や埼玉県の工事で発生した土砂を使用します。
土砂の搬入は令和５年１月より開始し、ダンプトラック(10t)で１日延べ40台程度を予定しています。また、土砂搬入は午前8：45～午後4：00とします。
４月末くらいを目途に搬入を終わらせた後、宅盤や道路部分の整地を行います。

道路工　５月頃より道路の路面排水を施工します。9月上旬頃より舗装工事を開始します。また、南側の道路も一部規制して舗装します。

上下水道工　３月中旬より南側の道路を規制して、区画整理地内から既設管路への接続管の施工を予定しています。

公園・調整池工　６月頃より調整池施設の施工を行います。調整池施設完了後に８月中旬頃から公園施設の施工をします。

防火水槽　５月下旬頃より防火水槽の施工を開始します。

ゴミ置場　８月下旬頃よりゴミ置場の施工を開始します。

確定測量等　造成の完了後、確定測量業務を開始します。

【写-1】

（仮囲い）

（看板）

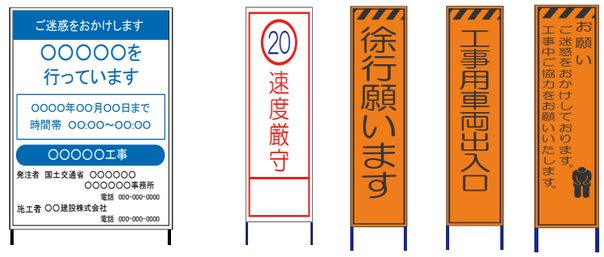

【図-1】

【図-2】

工　事　工　程　表

作業内容	令和４年 10	11	12	令和５年 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
準備工															
整地土工															
道路工															
上下水道工															
公園・調整池工															
防火水槽															
ゴミ置場															
確定測量等															
